

VINGMED

KUNDECASE FRA NAV 2018 TIL BUSINESS CENTRAL

Oseberg kundedag 14 november 2024

Vingmed skal være den ledende leverandør av produkter, tjenester og innovasjoner som bidrar til et bedre, tryggere og mer effektivt helsevesen.

1)Pasient – 2)Kompetanse – 3)Samfunnsansvar

High Competence Strong Relations in the Nordics

- 180 employees
- Partners from 41 countries
- Global networking
- 1,2 mrd. NOK / 100 M€



INTENSIVE CARE
ANESTHESIA/EMS



SURGERY



MEDICAL IT



CLOSED LOOP
MEDICATION



ENDOSCOPY



INTERVENTION



CARDIOLOGY



NEURO



LAB



OB CARE



HOME CARE
/ B2B



SERVICE

VINGMED AS
Oslo

VINGMED OY
Helsinki


VINGMED AB
Stockholm

VINGMED A/S
Copenhagen



VINGMED

VINGMED > 10 ÅR MED STERK ØKONOMISK VEKST.....

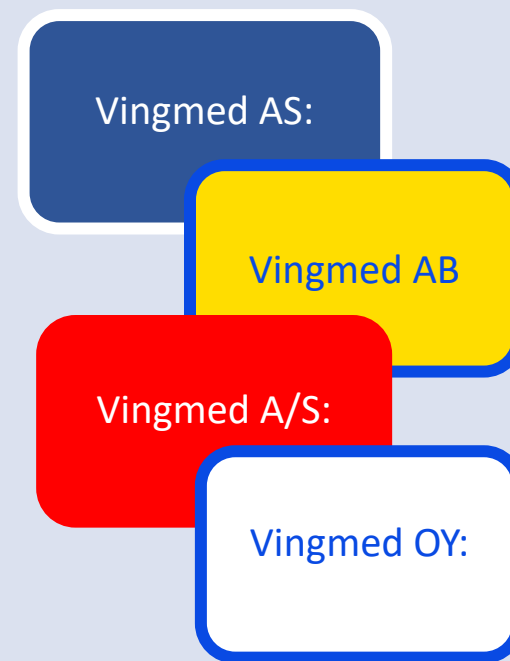


VINGMED

Morten Svendsen



- 81 Edinburgh - Bus.degree
- 81 Oslo – Aker Oil&Gas (Financial)
- 85 Newcastle – Aker UK (Financial)
- 87 Oslo – Aker Property dev. (Financial)
- 91 Stord – Aker Subsea (Financial)
- 94 Ghana – Scancem (Financial)
- 99 Oslo – Scancem (IT)
- **01 Oslo – Serve (IT startup)**
→ Scancem Nigeria (Financial)
- 04 Oslo – Evry (IT)
- **07 Oslo – Health Tech (IT startup)**
- **14 Oslo – Framsikt (IT startup)**
- 14 Oslo – Consultant (IT)
→ 14 Asker – Vingmed (IT)
→ 15 Oslo – POD (Financial)
- 17 Asker – Vingmed (MIKT)

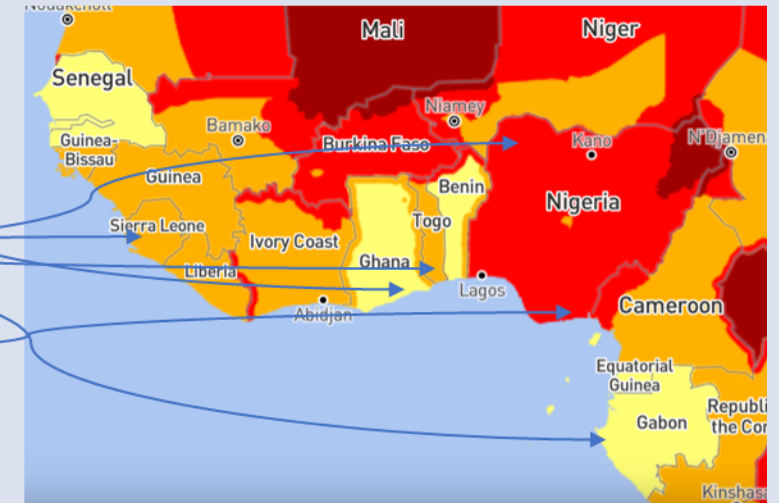

VINGMED


VINGMED SNART 67 OG > 30 ÅR MED NAV

Vingmed AS:

Vingmed AB

Vingmed A/S:

Vingmed OY:



VINGMED

VINGMED > 30 ÅR MED NAV

- Hvert selskap har levd sitt eget liv
- Alle funksjoner var transaksjonsbaserte
- All fokus mot å vareflyt inn/ut
- Ingen harmonisering av funksjoner
- Ingen utvikling av økonomimodell
- NAV:
 - Ca.1000 programmerte objekter
 - 219 «rapporter»

1. Teknisk gjeld
2. Organisatorisk gjeld

Vingmed A/S:

Vingmed AB

Vingmed AS:

Vingmed OY:



VINGMED

VINGMED FORPROSJEKT - NAV 2018 TIL BUSINESS CENTRAL

- ❖ Våren - 22 Innledende diskusjon m.eksisterende NAV leverandør
- ❖ Aug - 22 Planlegger oppgradering NAV2018
- ❖ Sep-nov - 22 Vingmed får «kalde føtter»
- ❖ Nov - 22 Vingmed tar en «fot i bakken»
- ❖ Feb - 23 Vingmed signerer Oseberg som ny leverandør
- ❖ 13 juni - 23 «Pre study» kick off – 2 dager i Tønsberg
- ❖ 18 okt. - 23 Utkast rapport Forprosjekt
- ❖ 15 nov - 23 Vingmed og Oseberg signerer SSA-Cloud



VINGMED

Fremdrift/plan - Milepælsplan

– Design – Development
– Training – Installation

Test

System	Milepæl	Ferdigdato	Uke	Januar																									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
BC	MA1 Projectplan v1 established	31.01.2024	5																										
BC	MA2 Analysis completed	31.01.2024	5																										
BC	MD1 Installation of standard BC completed	29.02.2024	9																										
BC	MD2 Training super users completed	15.03.2024	11																										
BC	MD3 Specifications of customizations and integrations completed	29.02.2024	9																										
BC	MD4 Design completed	15.03.2024	11																										
BC	MU1 Installation of additional products completed	18.03.2024	12																										
BC	MU2 Setup of BC completed	30.04.2024	18																										
BC	MU3 Development of customizations and integrations completed	30.04.2024	18																										
BC	MI1 System test customer completed	07.05.2024	19																										
BC	MI2 System reported ready for UAT	07.05.2024	19																										
BC	MI3 GO / NOGO from start of operations	20.05.2024	21																										





VINGMED - PROSJEKTPLAN

HOVEDAKTIVITET	BESKRIVELSE	FRIST
0	SIGNERING KONTRAKT	15.11.2023
1	PROSJEKT START / ANALYSE	15.12.2023
2	DESIGN OPPSTART	15.01.2024
3	UTVIKLING	30.04.2024
4	GO-LIVE VINGMED AS (NO)	01.06.2024
6	GO-LIVE VINGMED AB (SE)	01.10.2024
7	GO-LIVE VINGMED A/S (DK)	01.11.2024
8	GO-LIVE VINGMED OY + VINGMED HOLDING	01.12.2024
9	AKSEPTANSE	31.01.2025




VINGMED KRITERIA FOR BUSINESS CENTRAL

- ØKT BRUK AV STANDARD BC FUNKSJONER
- REDUSERE UTVIKLING AV TILPASNINGER
- HARMONISERING AV ØK.MODELL:
 - Felles kontoplan
 - Felles dimensjonsstruktur
- UTVIKLE FELLE RAPPORTEINGSLØSNING MED POWER BI
- ETABLER FELLE LØSNINGER FOR:
 - Service funksjon
 - Webshop
 - CRM




VINGMED > 30 ÅR MED NAV

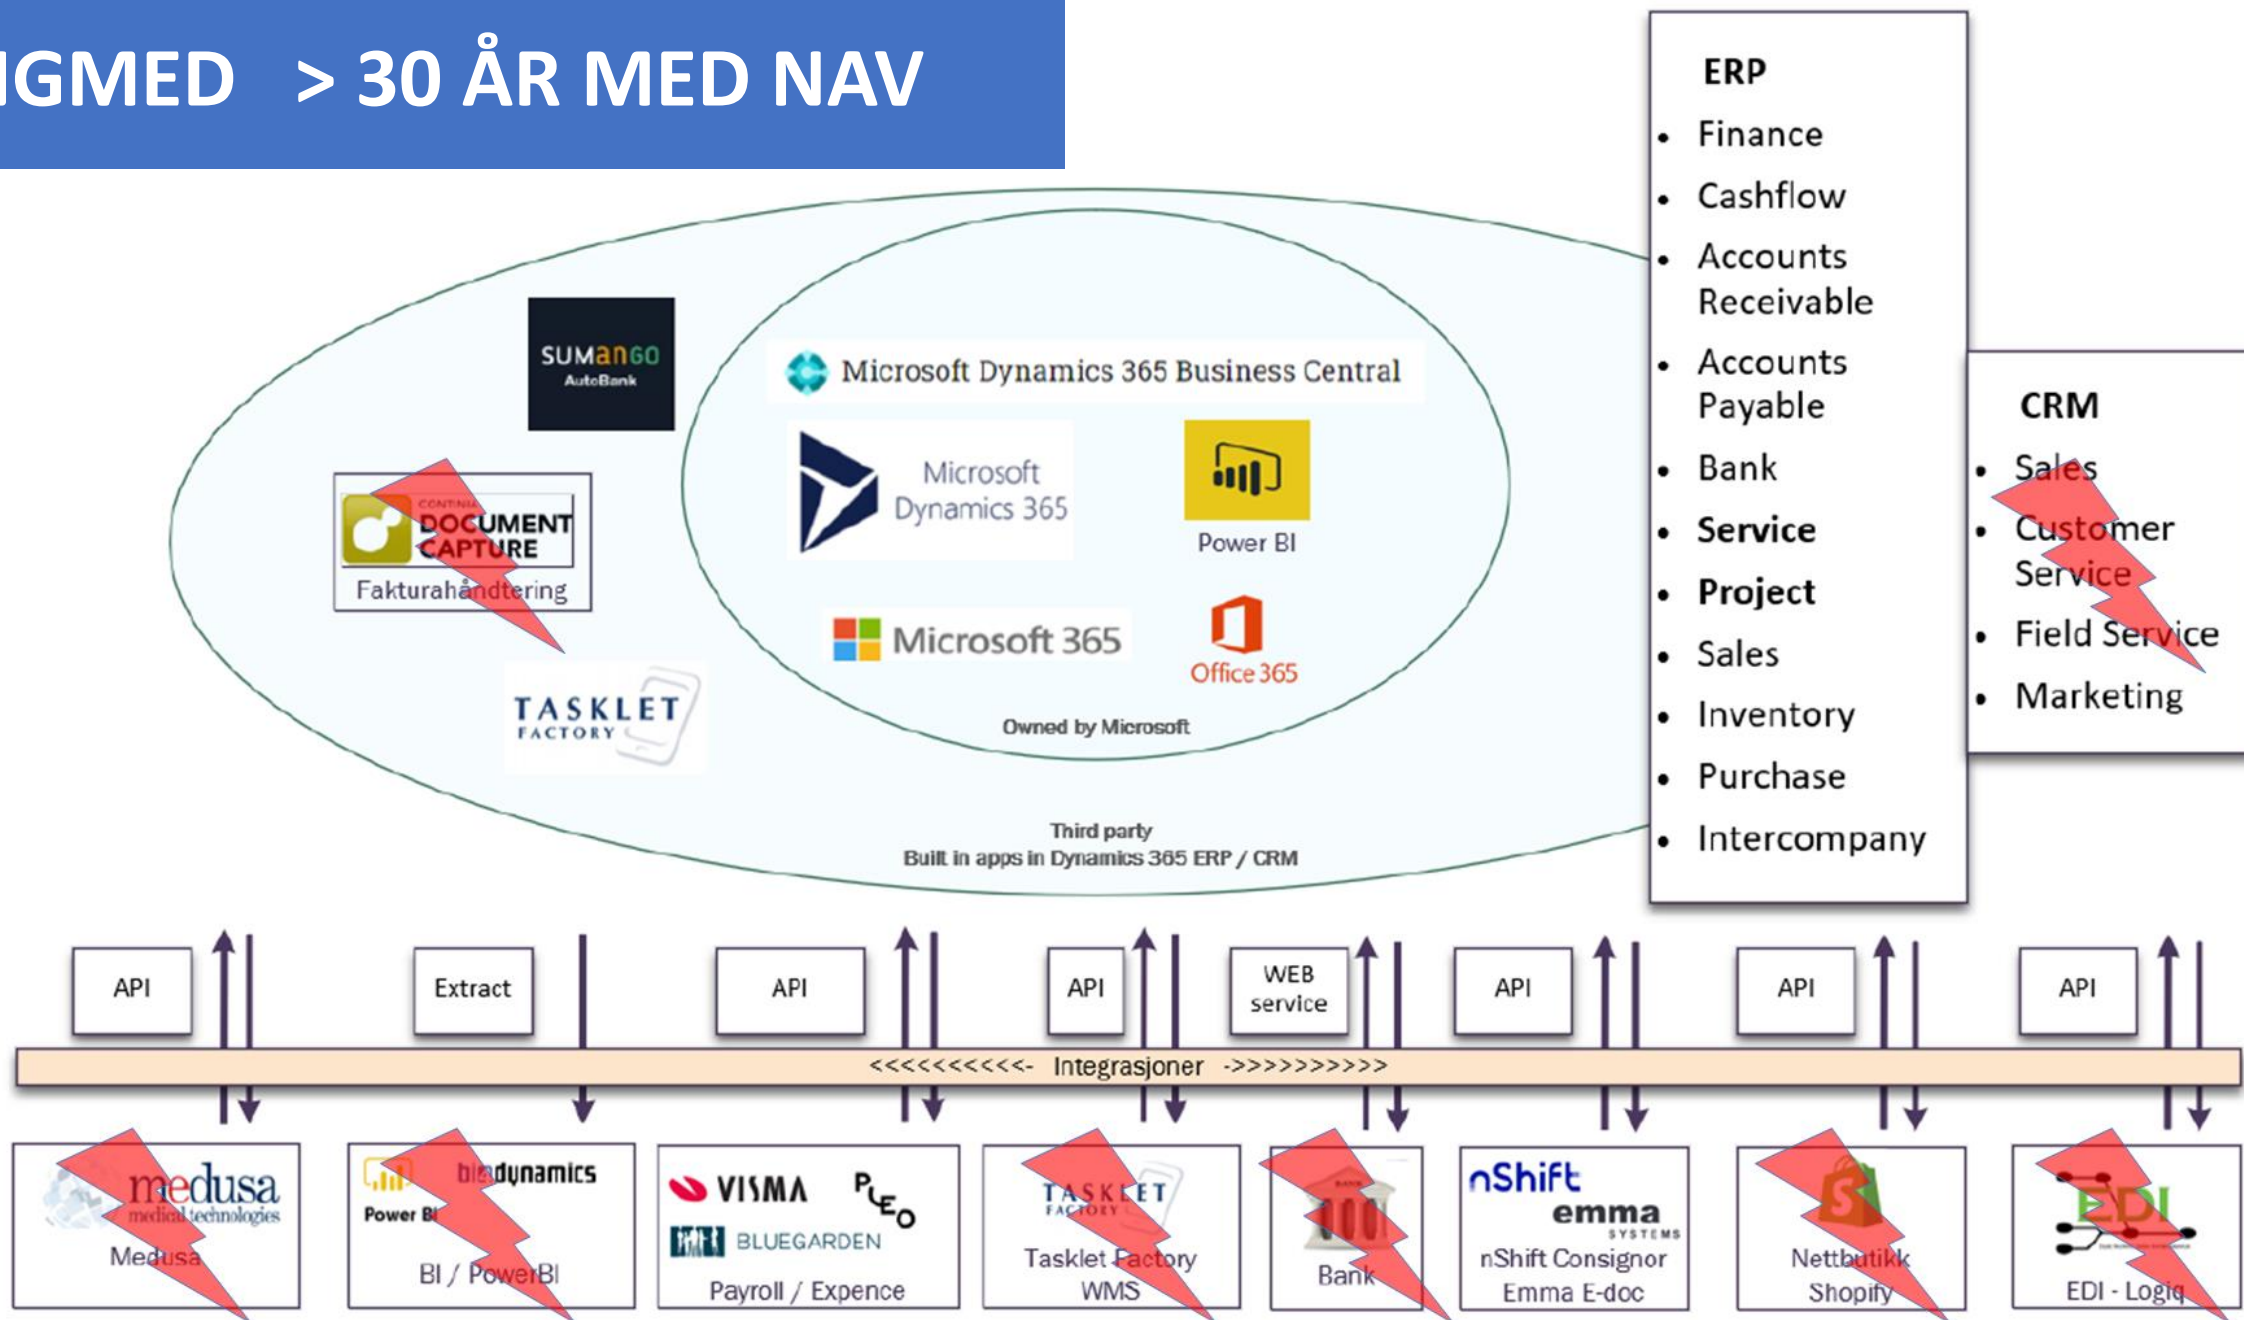

BUSINESS CENTRAL → NAVET

BC Manhours «Visma» Expenses

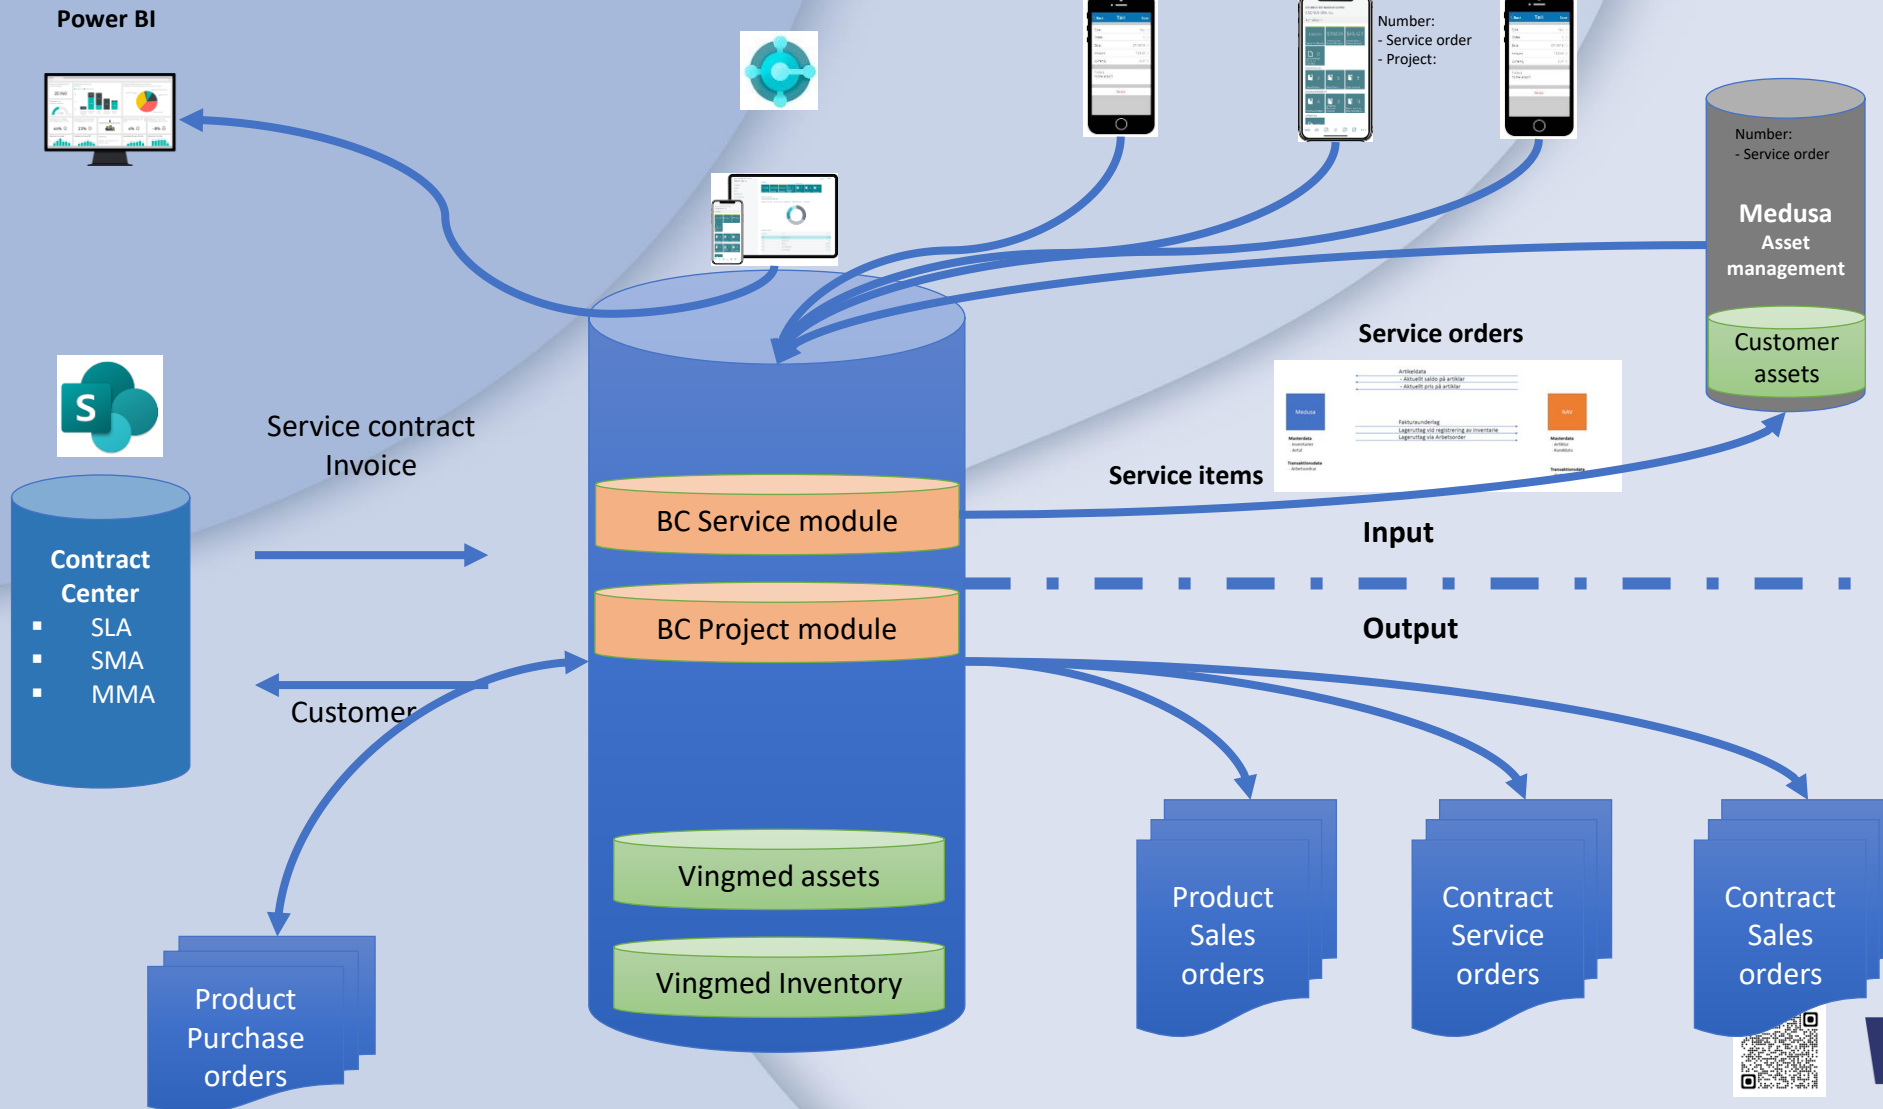


VINGMED – HVORDAN HAR DET GÅTT ??

HOVEDAKTIVITET	BESKRIVELSE	FRIST
0	SIGNERING KONTRAKT	01.11.2023
1	PROSJEKT START / ANALYSE	15.12.2023
2	DESIGN OPPSTART	15.01.2024
3	UTVIKLING	30.04.2024
4	GO-LIVE VINGMED AS (NO)	10.06.2024
5	GO-LIVE VINGMED HOLDING	09.09.2024
6	GO-LIVE VINGMED AB (SE)	01.10.2024
7	GO-LIVE VINGMED A/S (DK)	04.11.2024
8	GO-LIVE VINGMED OY	02.12.2024
9	AKSEPTANSE	31.01.2025



VINGMED

VINGMED – OPPSUMMERING TIDSAKSE 2022 - 2025

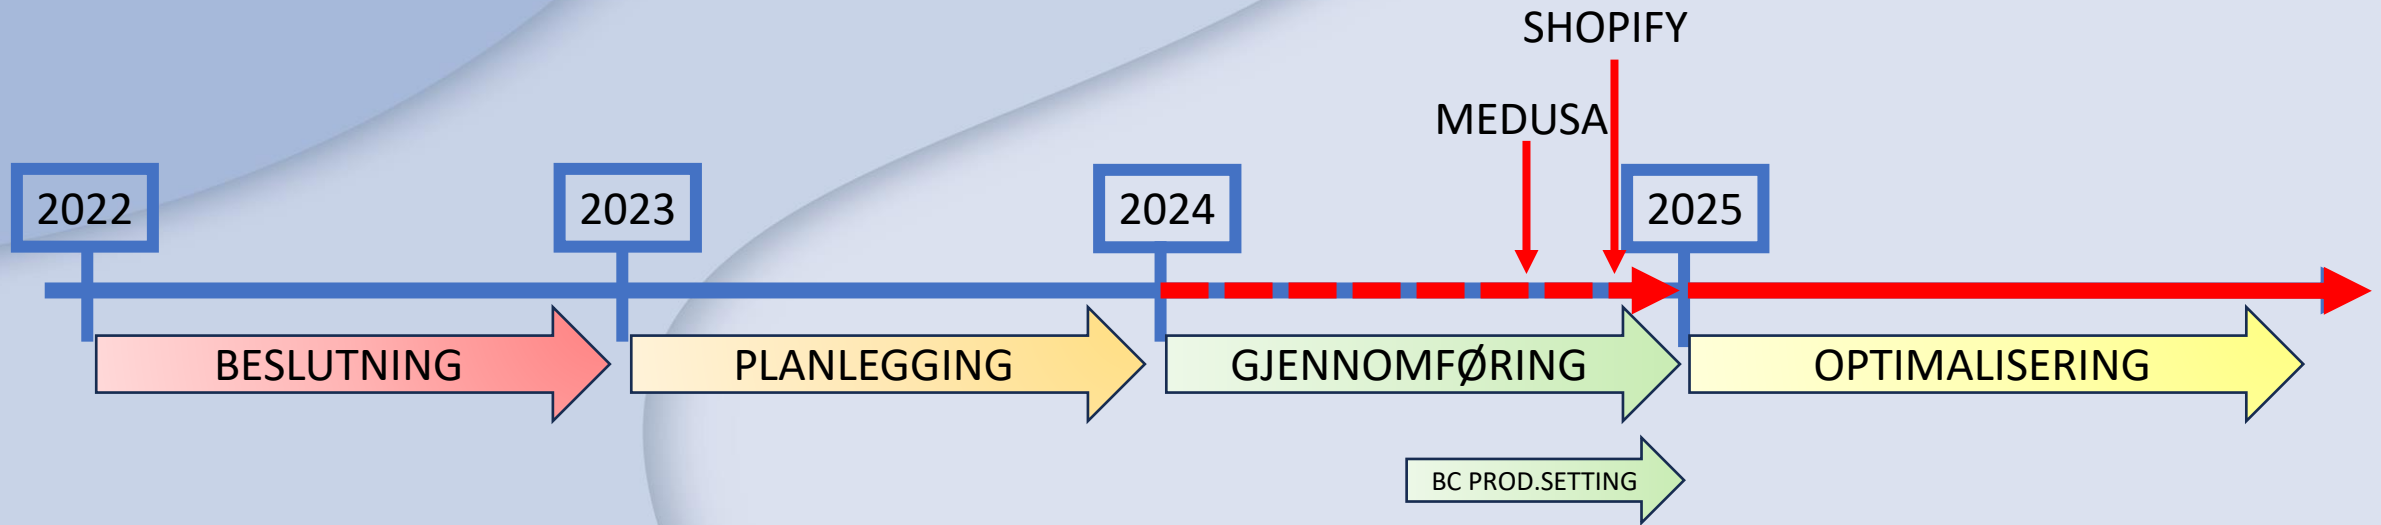

VINGMED PROSJEKTØKONOMI BUSINESS CENTRAL (BC)

BESKRIVELSE	ESTIMAT TIMER	PROGNOSE TIMER
HOVEDLEVERANSE IMPLEMENTERING	625	700
TILPASNINGER	1170	800
INTEGRASJONER	529	300
PROSJEKTLEDELSE	476	400
KURS OG INSTALLASJON	50	50
ANNEN BISTAND	0	1050
TOTALPRIS BUSINESS CENTRAL	2850	3300



VINGMED

VINGMED HOVEDPROSJEKT – HVA HAR VI LYKKES MED?

- ØKT BRUK AV STANDARD BC FUNKSJONER
- REDUSERT UTVIKLING AV TILPASNINGER
- HARMONISERING ØKONOMI MODELL:
 - Felles kontoplan
 - Felles dimensjonsstruktur
- **UTVIKLE FELLES RAPPORTERINGSLØSNING MED POWER BI**
- ETABLERT FELLES LØSNINGER FOR:
 - Logistikk m.skanning (Tasklet)
 - Service funksjon (Medusa)
 - Webshop (Shopify)
 - CRM



VINGMED

VINGMED > 30 ÅR MED NAV OPPSUMMERT..

Teknisk gjeld

Organisatorisk gjeld



VINGMED

Oppsummering Business Central:

«Vingmed er nå i posisjon til å.....»

→ «Effektivisere den operative virksomhet»

→ «Øke inntjening og redusere kostnader ved bedre økonomisk kontroll»



VINGMED

OSEBERG SITT TEAM



FORSTUDIE:

1. TORE MYHRE
2. ERIK HORNTVEDT
3. ANDERS JENSEN

IMPLEMENTERINGS:

4. SVEIN BADE
5. ANDREAS HVIDSTEN
6. MORTEN BALE
7. NIKOLINE S.KIRKEDAM
8. CHRISTIAN FREDRIK BROCH



VINGMED



FORSTUDIE:

- 1. TORE MYHRE**
- 2. ERIK HORNTVEDT**
- 3. ANDERS JENSEN**

IMPLEMENTERINGS:

- 4. SVEIN BADE**
- 5. ANDREAS HVIDSTEN**
- 6. MORTEN BALE**
- 7. NIKOLINE S.KIRKEDAM**
- 8. CHRISTIAN FREDRIK BROCH**



VINGMED
